



# **MS PROJECT 2016**

## **CREACIÓN DE UN PLAN DE PROYECTO**

**Eric Gustavo Coronel Castillo**  
**[www.desarrollasoftware.com](http://www.desarrollasoftware.com)**  
**[gcoronelc@gmail.com](mailto:gcoronelc@gmail.com)**

# Temas



- Objetivo
- Información básica del proyecto
- Tipos de tareas
- Información de tarea
- Estimar duración de tarea
- Vincular tareas
- Tareas transcurridas
- Esquemas o fases de un proyecto
- Tareas repetitivas
- Tarea resumen del proyecto

# OBJETIVO

Crear un plan de proyecto indicando las tareas resúmenes e hitos del proyecto.

Nombre de tarea	Duración
<b>Proyecto: Construcción Mi Casa</b>	<b>44 días</b>
Inicio del Proyecto	0 días
<b>Fase Cimientos</b>	<b>5 días</b>
<b>Fase Estructural</b>	<b>24 días</b>
Inicio de Fase	0 días
Columnas y vigas	1 sem
Paredes	2 sem.
Piso	3 días
Encofrado y techo	7 días
Llenado de techo	2 días
Fin de Fase	0 días
<b>Fase Mecánica</b>	<b>44 días</b>
<b>Fase Acabado Exterior e Interior</b>	<b>6 días</b>
Fin del Proyecto	0 días

# INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO

Información del proyecto 'Proyecto1' ✕

Fecha de comienzo: 19/01/2016 ▼ Fecha actual: 19/01/2016 ▼

Fecha de fin: 19/01/2016 ▼ Fecha de estado: NOD ▼

Programar a partir de: Fecha de comienzo del proyecto ▼ Calendario: Estándar ▼

Todas las tareas comienzan lo antes posible. Prioridad: 500 ▲▼

Campos personalizados de empresa

Departamento: ▼

Nombre de campo personalizado	Valor
-------------------------------	-------

Ayuda Estadísticas... Aceptar Cancelar

# INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO

Estadísticas del proyecto 'Proyecto1' ×


	Comienzo	Fin
Actual	19/01/2016	19/01/2016
Previsto	NOD	NOD
Real	NOD	NOD
Variación	0d	0d

	Duración	Trabajo	Costo
Actual	0d?	0h	S/.0.00
Previsto	0d	0h	S/.0.00
Real	0d	0h	S/.0.00
Restante	0d?	0h	S/.0.00

Porcentaje completado:  
Duración: 0%      Trabajo: 0%

Cerrar

# TIPO DE TAREAS

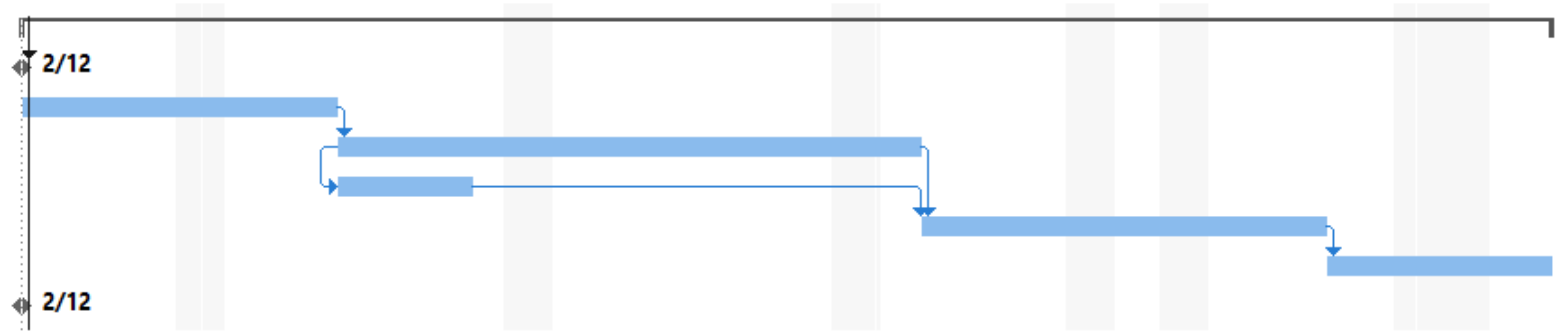

- Tareas resúmenes
- Tareas
- Hitos

# INFORMACIÓN DE TAREA

Información de la tarea

×

General

Predecesoras

Recursos

Avanzado

Notas

Campos pers.

Nombre:

Preparar terreno

Duración:

1 día

↑

↓

☐ Estimada

Porcentaje completado:

0%

↑

↓

Prioridad:

500

↑

↓

Modo de programación:

☐ Programada manualmente

☒ Programada automáticamente

☐ Inactiva

Fechas

Comienzo:

2/12/2015

▼

Fin:

2/12/2015

▼

☐ Mostrar en escala de tiempo

☐ Ocultar barra

☐ Resumida

Ayuda

Aceptar

Cancelar


# ESTIMAR DURACIÓN DE TAREA

AL ESCRIBIR	APARECE COMO	SE INTERPRETA
1m 2m	1 min 2 mins	minuto minutos
1h 2h	1 hora 2 horas	hora horas
1d 2d	1 día 2 días	días días
1s 2s	1 sem 2 sem	semana semanas
1ms 2ms	1 ms 2 mss	mes meses



# ESTIMAR DURACIÓN DE TAREA

Archivo / Opciones / Avanzado


Mostrar opciones para este proyecto:  Todos los proyectos nuevos ▼


Minutos:	<input type="text" value="m"/>	▼	Semanas:	<input type="text" value="s"/>	▼
Horas:	<input type="text" value="h"/>	▼	Meses:	<input type="text" value="me"/>	▼
Días:	<input type="text" value="d"/>	▼	Años:	<input type="text" value="a"/>	▼

☒ Agregar espacio delante de la etiqueta

☒ Mostrar tarea de resumen del proyecto


☒ Subrayar hipervínculos

Color de hipervínculo:  ▼

Color de hipervínculo visitado:  ▼

# ESTIMAR DURACIÓN DE TAREA

## Archivo / Opciones / Programación

Opciones de calendario para este proyecto:  Proyecto1 ▼

La semana comienza en: Domingo ▼

El año fiscal comienza en: Enero ▼

☐ Usar el año inicial para la numeración de los años fiscales

Hora de comienzo predeterminada: 9:00 a. m. ▼

Hora de fin predeterminada: 7:00 p. m. ▼

Horas por día: 8 ▼

Horas por semana: 40 ▼

Días por mes: 20 ▼

Se asignan estos horarios a las tareas cuando se escribe una fecha de comienzo o fin sin especificar una hora. Si cambia esta configuración, es conveniente hacerla coincidir con el calendario del proyecto mediante el comando Cambiar tiempo de trabajo de la ficha Proyecto en la cinta.

# VINCULAR TAREAS



Este botón permite vincular las tareas seleccionadas.




Este botón permite desvincular las tareas seleccionadas.

Nombre de tarea ▼	Duración ▼	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
Tarea 1	2 días														
Tarea 2	3 días														
Tarea 3	2 días														


# DURACIÓN TRANSCURRIDA

## Duración Transcurrida

Duración ▼
5 dt
3 días
2 días

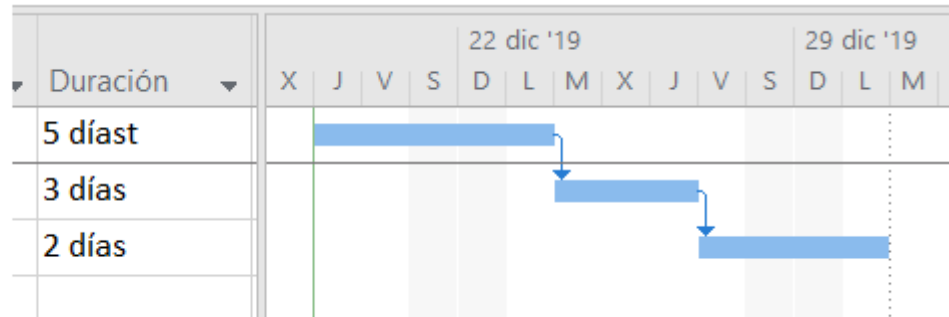

# ESQUEMAS O FASES DE UN PROYECTO

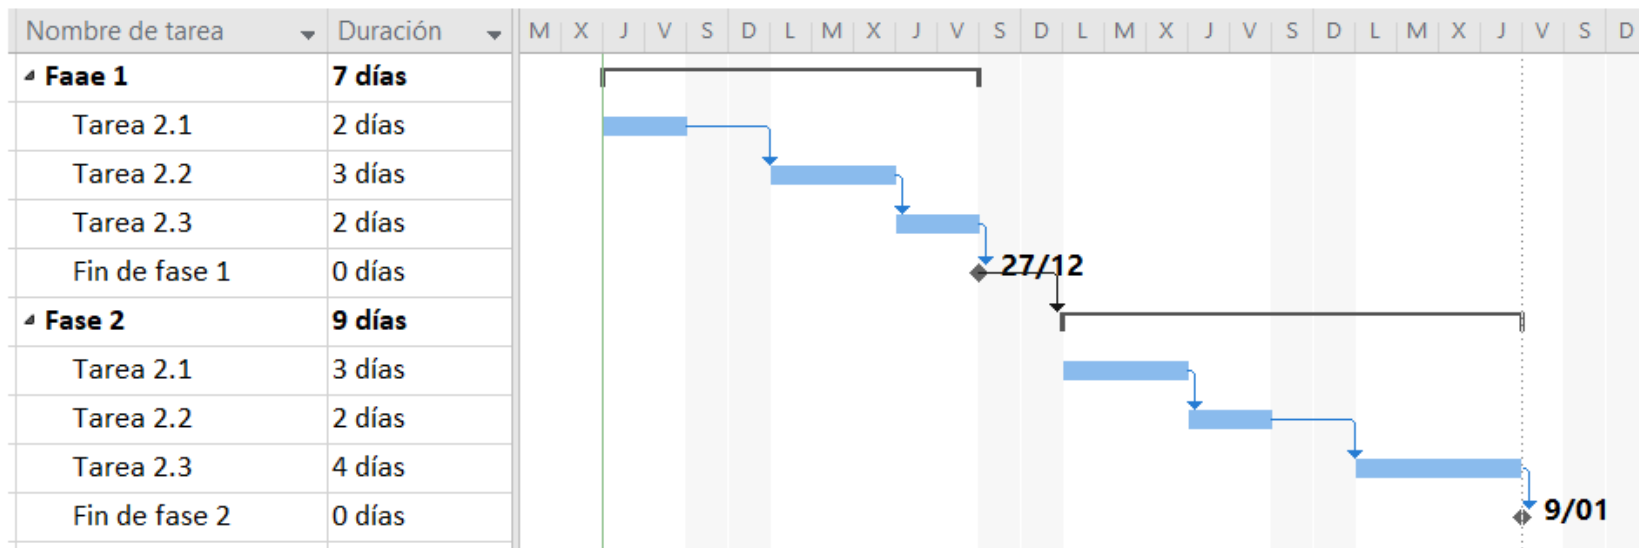

# TAREAS REPETITIVAS

Información de tarea repetitiva

Nombre de tarea:

Reunión de Equipo

Duración:

1d

Patrón de repetición

☐ Diario

☒ Semanal

☐ Mensual

☐ Anual

Repetir cada

1

semanas el:

☐ domingo

☒ lunes

☐ martes

☐ miércoles

☐ jueves

☐ viernes

☐ sábado

Intervalo de repetición

Comienzo:

19/01/2016

☒ Terminar después de:

10

veces

☐ Terminar el:

28/03/2016

Calendario para programar esta tarea

Calendario:

Ninguno

☐ La programación omite los calendarios de recursos

Ayuda


Aceptar

Cancelar

# TAREA RESUMEN DEL PROYECTO

---


En la pestaña formato encuentras la ficha "**Mostrar u ocultar**", tal como se muestra en la siguiente imagen:

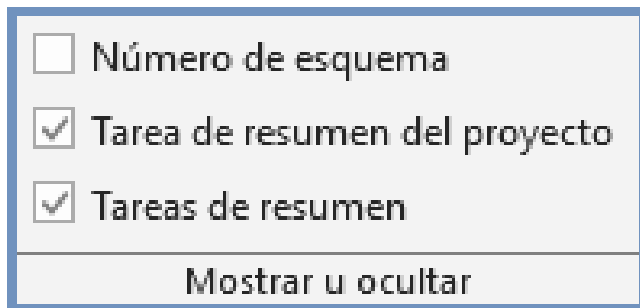

<input type="checkbox"/> Número de esquema
<input checked="" type="checkbox"/> Tarea de resumen del proyecto
<input checked="" type="checkbox"/> Tareas de resumen
Mostrar u ocultar

# TAREA RESUMEN DEL PROYECTO

Archivo / Opciones / Avanzado


Mostrar opciones para este proyecto:  Proyecto1 ▼


Minutos:	m ▼	Semanas:	s ▼
Horas:	h ▼	Meses:	me ▼
Días:	d ▼	Años:	a ▼

☒ Agregar espacio delante de la etiqueta

☒ Mostrar tarea de resumen del proyecto

☒ Subrayar hipervínculos

Color de hipervínculo: 

Color de hipervínculo visitado: 







# MS PROJECT 2016

**Gracias**

**Eric Gustavo Coronel Castillo**  
**[www.desarrollasoftware.com](http://www.desarrollasoftware.com)**  
**[gcoronelc@gmail.com](mailto:gcoronelc@gmail.com)**
