

MS PROJECT 2016

INTRODUCCIÓN

Eric Gustavo Coronel Castillo www.desarrollasoftware.com gcoronelc@gmail.com



Temas

- Objetivo
- Project Management Institute
- Guía del PMBOK
- ¿Qué es un Proyecto?
- Fijación de objetivos
- Portafolio, Programa y Proyectos
- Dirección de Proyectos
- Grupo de Procesos
- Áreas del Conocimiento
- MS Project Bajo el Enfoque PMBOK
- Proyecto Vs Recurso

OBJETIVO

Conocer los conceptos fundamentales sobre la gestión de proyectos.



PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI




Institución sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos.

GUIA DEL PMBOK

Es la Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos, es un libro en el que se presentan estándares, pautas y normas para la gestión de proyectos.

La sexta edición del libro fue publicada el 6 de septiembre de 2017, bajo la supervisión del Project Management Institute.



¿QUÉ ES UN PROYECTO?

Según el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

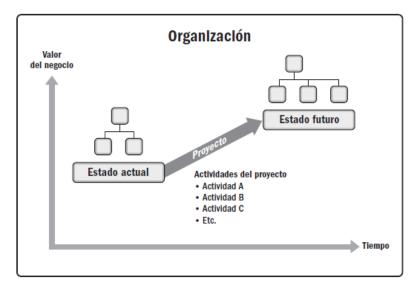


Gráfico 1-1. Transición del Estado de una Organización a través de un Proyecto

¿QUÉ ES UN PROYECTO?

Situaciones por las que un proyecto finaliza:

- Cuando se logran los objetivos del proyecto.
- Cuando los objetivos del proyecto no se cumplen o no pueden ser cumplidos.
- Cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.



FIJACIÓN DE OBJETIVOS




Ejercicio 1



Elaborar tres ideas de proyectos del lugar donde trabaja o del distrito en donde vive y establece los objetivos del proyecto según las recomendaciones SMART.

PORTAFOLIO, PROGRAMA Y PROYECTOS

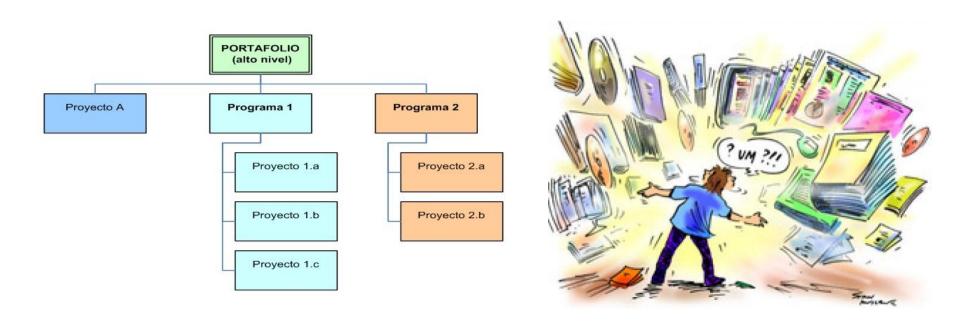

https://youtu.be/QP88vCHG58c

Ejercicio 2



Elaborar tres ideas de programas del lugar donde trabaja o del distrito en donde vive y sustentarlas.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de las técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva.

Es una competencia estratégica para las organizaciones, y les permite atar los resultados de los proyectos a las metas del negocio, y así competir mejor en su mercado.






¿Qué es un proceso?

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido.

Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que puedan aplicarse y por las salidas que se obtienen.

procesos de grupos 5

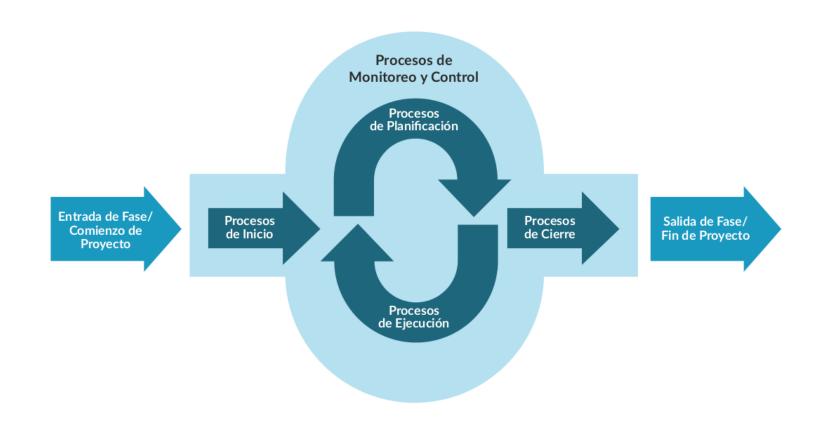

- Son 5 grupos de procesos
 - Iniciación

El Grupo del Proceso de Iniciación está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase.

Dentro de los procesos de iniciación, se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales.

- Son 5 grupos de procesos
 - Planificación

El Grupo del Proceso de Planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos.

Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo.

- Son 5 grupos de procesos
 - Ejecución

El Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo.

Este grupo de proceso implica coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las actividades del proyecto de conformidad con el plan para la dirección del proyecto

- Son 5 grupos de procesos
 - Seguimiento y control

El grupo del Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos procesos requeridos para supervisar, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.

El beneficio clave de este grupo de procesos radica en que el desempeño del proyecto se observa y se mide de manera sistemática y regular, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto.

- Son 5 grupos de procesos
 - Cierre

El Grupo del Proceso del Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales.

AREAS DEL CONOCIMIENTO

- 1. Gestión de la integración
- 2. Gestión del alcance
- 3. Gestión del tiempo
- 4. Gestión del costo
- 5. Gestión de la calidad
- 6. Gestión de recursos
- 7. Gestión de las comunicaciones
- 8. Gestión de riesgos
- 9. Gestión de adquisiciones
- 10. Gestión de los interesados

MS PROJECT BAJO EL ENFOQUE PMBOK

- MS Project proporciona un gran apoyo en las áreas de conocimiento:
 - Gestión de Tiempo
 - Para desarrollar un cronograma.
 - Gestión del costo
 - Para definir un presupuesto.


MS PROJECT BAJO EL ENFOQUE PMBOK

- MS Project proporciona un gran apoyo a los siguientes grupos de procesos:
 - Grupo de Procesos de Planificación
 - Para establecer un plan.
 - Grupo de Procesos de Seguimiento y Control
 - Seguimiento del plan.
 - Control de variaciones entre lo planificado vs lo real.

PRODUCTO VS. PROYECTO



PRODUCTO VS. PROYECTO

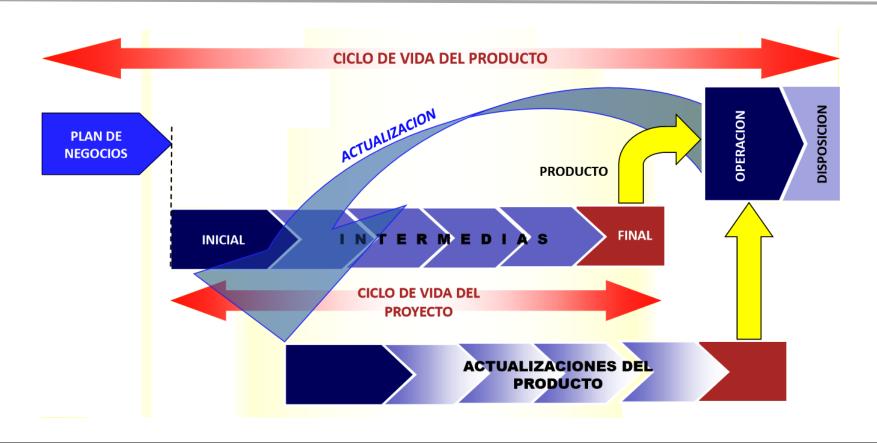





MS PROJECT 2016

Gracias

Eric Gustavo Coronel Castillo www.desarrollasoftware.com gcoronelc@gmail.com
